



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Departamento Nacional de Planeación

www.dnp.gov.co



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – DIFP

Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública - SPIIP



¿Por qué hacer seguimiento a proyectos de inversión

Mostrar resultados - Facilita el control de la ejecución y la preparación de los reportes.

Explicar a los demás lo que sucede y por qué se logran o no los resultados esperados. Apoyar los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Fomentar la confianza de la alta gerencia, los organismos de financiación y control y la ciudadanía

Presentar argumentos en favor de los cambios necesarios

Ahorrar tiempo y recursos al gerente del proyecto en el control y toma de decisiones del proyecto.



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

¿Qué es el SPI?

Es una herramienta que :

- Facilita la recolección y análisis continuo de información para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos.
- Constituye la base para la adopción de medidas correctoras con el fin de mejorar el diseño, aplicación y calidad de los proyectos de inversión.
- Permite tomar decisiones durante la implementación del proyecto, mediante una comparación entre los resultados esperados y el avance de los mismos.



Importancia de la cadena de valor en el seguimiento



El seguimiento permitirá identificar si los recursos y actividades desarrolladas en el proyecto de inversión están generando los productos definidos durante la formulación.

Productividad: ¿Cuánto puedo producir con determinados productos?

Costo de oportunidad: ¿Qué dejo de producir al generar el producto del proyecto?

Eficiencia: ¿A qué costo genero un producto en comparación con otro proyecto?



DNP Departamento Nacional de Planeación

La cadena de valor en el SUIFP



SUIFP .dnp.gov.co
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS



CADENA DE VALOR

- Objetivos Especificos
- Productos por Objetivo Especifico
- Actividades por Producto
- Costo de las Actividades
- Indicadores de Producto
- Metas y Regionalización de Indicadores de Producto
- Ponderación de Indicadores
- Cargue Masivo Cadena de Valor
- Reporte estructura básica cadena de valor

Productos y Actividades:

Objetivo específico	Producto				
+	Alinear las acciones de la ANSPE en el territorio	Sistema de Planeación por Resultados			
Actividad	Etapas	F. Inicial (aaaa-mm-dd)	F. Final (aaaa-mm-dd)	Ruta Crítica	
Diseñar el Sistema de Planeación por Resultados	Inversión	2014/01/01	2015/12/31	S	
Implementar el Sistema de Planeación por Resultados	Operación	2014/01/01	2015/12/31	S	
+	Alinear las acciones de la ANSPE en el territorio	Sistema de Gestión Integral			
Actividad	Etapas	F. Inicial (aaaa-mm-dd)	F. Final (aaaa-mm-dd)	Ruta Crítica	
Desarrollar la encuesta de satisfacción de familias	Operación	2013/04/14	2015/12/31	S	
+	Alinear las acciones de la ANSPE en el territorio	Ciclo de gestión del conocimiento			
Actividad	Etapas	F. Inicial (aaaa-mm-dd)	F. Final (aaaa-mm-dd)	Ruta Crítica	
Diseñar el ciclo	Preinversión	2014/02/01	2015/12/31	S	

El registro de los avances en el SPI dependerá de la calidad de la información reportada durante los procesos de actualización de los proyectos de inversión adelantados en el SUIFP.



Estructura SPI 2013

Información básica

- Datos básicos del proyecto
- Avance del proyecto
- Ejecución presupuestal (focalización y regionalización)

Actividades

- Avance cronológico del proyecto

Indicadores

- Registro de avance de indicadores de producto (Regionalización)
- Registro de avance de indicadores de gestión

Estructura SPI 2014

Datos básicos

- Información general
- Resumen de avances
- Cadena de valor

Presupuestal

- Ejecución presupuestal (Regionalización y/o Focalización)

Productos

- Avance productos e indicadores de producto BIS (Según cadena de valor)

Actividades

- Avance financiero de las actividades (Según la cadena de valor)

Gestión

- Avance indicadores de gestión



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Registro de información de avance en el SPI – 2014

Para resolver problemas que se puedan presentar durante el registro de información en el SPI, favor dirigirse a la Mesa de ayuda:

Correo electrónico: suip@dnpp.gov.co

Teléfono: 7051060 **Es muy importante que tener un número de ticket**

Estar atentos al portafolio de capacitación que ofrece la SPIIP en el siguiente link:

<https://www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzas/C3%BAblicas/5Capacitaci%C3%B3nyAsistenciaT%C3%A9cnica.aspx>



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 1: Ingreso al SPI



DNP Departamento Nacional de Planeación

Paso 1: Ingreso al SPI



SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN



Consultas Consultas Historico **Ingreso a Funcionario**

Para registrar información haga clic aquí



SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Consultas Consultas Historico **Ingreso a Funcionario**

sábado, 08 de febrero de 2014 Pruebas: vfauno

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

[Recordar Contraseña](#)

Digite el usuario provisto por el administrador del SPI en su entidad

Digite la contraseña provista por el administrador del SPI en su entidad

Pulse el botón para ingresar



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

**Paso 2: Búsqueda del
proyecto del cual se
quiere registrar el avance**



DNP Departamento Nacional de Planeación

Paso 2: Búsqueda del proyecto del cual se quiere registrar el avance

Consultas Seguimiento Consultas Historico

sábado, 08 de febrero de Pruebas: vfauno



Entidad unidad especial aeronautica Usuario: NELSON MENDIVELSK
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)

Para iniciar el registro de información habla clic aquí

Si quiere consultar la información registrada de los proyectos entre 2008 y 2013 acceda a esta opción

Visualizará el nombre de gerente del proyecto y la entidad a la que pertenece

Paso 2: Búsqueda del proyecto del cual se quiere registrar el avance

 Registrar Seguimiento
 Consultar Seguimiento

[Inicio](#) | Seguimiento

Para registrar información despliegue esta opción

 Registrar Seguimiento
 Registrar Seguimiento
 Consultar Seguimiento

[Inicio](#) | Seguimiento

Pulse la opción "registrar seguimiento", para ingresar poder visualizar los proyectos de los cuales es responsable



Paso 2: Búsqueda del proyecto del cual se quiere registrar el avance

[Inicio](#) | [Seguimiento](#) | [Registrar Seguimiento](#) | [Registrar Seguimiento](#)

Registro



Código BPIN:

Nombre del Proyecto:

Sector: Entidad:

Responsable:

Vigencia: Período: Enero Periodicidad MENSUAL

Estas opciones le permitirán hacer la búsqueda del proyecto al que desea registrar el avance

Para hacer efectiva la búsqueda pulse este botón

Fecha límite de Registro de Información: 05/03/2014

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Compleitud	Cerrar Proyecto
0002080460000 - ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.	ABIERTO	07/05/2013 08:54:50 a.m.	2014 1-Enero					Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 08/02/2014 (Actualizado)	<input type="checkbox"/> (Sin Actualizar)
0002080480000 - ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL	CERRADO	11/04/2013 11:39:42 a.m.	2014 1-Enero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 06/02/2014 (Actualizado)	<input checked="" type="checkbox"/> 06/02/2014 (Actualizado)
0027021960000 - AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	ABIERTO	07/10/2013 06:06:56 p.m.	2014 1-Enero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión (Sin Actualizar)	<input type="checkbox"/> (Sin Actualizar)
0027022390000 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	ABIERTO	30/05/2013 06:12:13 p.m.	2014 1-Enero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión (Sin Actualizar)	<input type="checkbox"/> (Sin Actualizar)



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 3: Revisión del tablero del control del proyecto



Paso 3: Revisión del tablero de control del proyecto

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Complejitud	Cerrar Proyecto
0002080460000 - ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.	ABIERTO	07/05/2013 08:54:50 a.m.	2014 1-Enero	0,0%	0,0%	747,6%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 08/02/2014 (Actualizado)	<input type="checkbox"/> (Sin Actualizar)

El proyecto se encuentra en ejecución y por tanto puede registrar información de avance

Periodo de registro de la información

Corresponde a las obligaciones/apropiación

Fecha en que el control posterior de viabilidad subdirector del DNP viabilizó el proyecto, en esta fecha la información de base del SUIFP-BPIN fue migrada al SPI

Corresponde al porcentaje de ejecución registrado de los productos, ponderado por el peso que cada uno tiene en el costo total del proyecto

Es el porcentaje de avance de los indicadores de gestión, de acuerdo con la ponderación registrada en el SUIFP



Paso 3: Revisión del tablero de control del proyecto

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Complejitud	Cerrar Proyecto
0002080460000 - ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.	ABIERTO	07/05/2013 08:54:50 a.m.	2014 1-Enero	0,0%	0,0%	747,6%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 08/02/2014 (Actualizado)	<input type="checkbox"/> (Sin Actualizar)

Indica si se ha registrado correctamente la información en cada uno de los módulos del SPI, si este se encuentra en verde el registro habrá sido correcto y si está en rojo puede que no se haya registrado información o el registro es incorrecto

Pulse el nombre del proyecto para que pueda acceder al módulo de “datos básicos” del SPI

Si se selecciona esta opción el sistema le indicará que el proyecto ha concluido su ejecución y por ende no podrá registrar información de avance del proyecto de inversión (aunque podrá consultarlo)



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 4: Datos básicos del proyecto




Paso 4: Datos básicos del proyecto

Módulos del SPI, al estar en rojo indican que no se ha registrado información o el registro ha sido incorrecto

Podrá visualizar la ficha EBI del proyecto la cual es generada por el SUIFP - BPIN

Datos Básicos del Proyecto


Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestion
Anexos

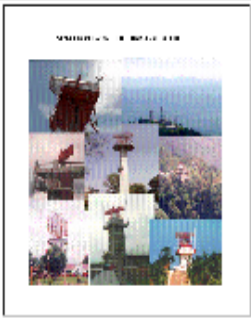

0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.**
 Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica
 Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones
 Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.
 Fecha Limite de Registro: 05/03/2014
 Sin Resumen Ejecutivo

- 2016
Periodo: 2014, Enero
Sin Ficha EBI

[Imagen](#) [\(Actualizar\)](#) [Borrar](#)

[Resumen Ejecutivo](#) [Cargar Resumen](#)


Información básica del proyecto

Pulse este link para actualizar o incluir una imagen alusiva al proyecto

Pulse este link para poder incluir el resumen ejecutivo del proyecto, este debe seguir los lineamientos establecidos por el DNP (no se deben incluir documentos anexos del seguimiento del proyecto)



Paso 4: Datos básicos del proyecto

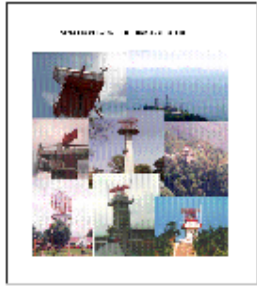

0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.**
Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica
Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones
Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.
Fecha Límite de Registro: 05/03/2014
Sin Resumen Ejecutivo

1995 - 2016

Periodo: 2014 - Enero
Sin Ficha EBI

[Imagen \(Actualizar Borrar\)](#)

[Resumen Ejecutivo Cargar Resumen](#)

Al pulsar "información general" el sistema desplegará el programa y subprograma presupuestal del proyecto, su objetivo y descripción las cuales vienen del SUIFP-BPIN

Información General .. (clic para expandir)

Programa
Subprograma

Objetivo
MEJORAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA AERONÁUTICA, DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA RADAR A NIVELES INFERIORES (TMA) Y SUPERIORES (RUTA) PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA EN EL ESPACIO AÉREO COLOMBIANO.

Descripción
DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DEL SECTOR AERONÁUTICO CONSAGRADOS DENTRO DEL RAC(REGLAMENTO AERONAUTICO DE COLOMBIA PARTE 19 QUE DEFINEN LA OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS AERONÁUTICOS; DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 10 DE 1993 EN DONDE SE ESTIPULA LA SEGURIDAD EN LOS MÁS ALTOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL SERVICIO COMO PILARES FUNDAMENTALES DE LA ENTIDAD Y ANEXO 10 DE OACI -TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS; LA ENTIDAD DEBE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO (ATS) CON LOS MÁS ALTOS ÍNDICES DE CALIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD EN TODAS AQUELLAS ESTACIONES AERONÁUTICAS O AEROPUERTOS EN DONDE SE REALIZAN CONTROL DE TRÁFICO

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Cadena de Valor .. (clic para expandir)



Paso 4: Datos básicos del proyecto

0027021960000 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica

Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones

Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.

1995 -

Valor solicitado por parte del proyecto en el SUIFP –BPIN

Valor registrado en el BPIN

Apropiación vigente registrada en el SIIF

Ejecución financiera del proyecto traída del SIIF

Información General .. (clic para ver más)

Resumen Avances .. (clic para ver más)

Vigencia	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Avance Financiero	Avance Físico	Avance Gestión	Avance Físico del Producto
2008-Dic	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.479.123.888,00	1.599.649.555,00	1.599.649.555,00	32%	0%	0%	N/A
2009-Dic	10.030.000.000,00	10.030.000.000,00	10.030.000.000,00	7.947.161.976,00	5.702.624.538,00	5.702.624.538,00	56,9%	100%	0%	N/A
2010-Dic	23.648.500.000,00	21.648.500.000,00	21.648.500.000,00	21.648.467.803,00	15.439.731.803,00	15.439.731.803,00	71,3%	25%	100%	N/A
2011-Dic	51.000.000.000,00	48.303.800.000,00	48.303.800.000,00	48.293.408.519,00	18.501.289.675,00	12.140.000.000,00	38,3%	0%	100%	N/A
2012-Dic	22.011.000.000,00	21.053.000.000,00	21.053.000.000,00	4.114.676.394,00	2.084.723.150,00	23.150,00	9,9%	100%	0%	N/A
2013-Dic	19.698.000.000,00	20.825.000.000,00	20.825.000.000,00	7.836.140.000,00	7.760.518.000,00	0,00	37,3%	0%	0%	N/A
2014-Ene	32.389.000.000,00	15.731.000.000,00	15.731.000.000,00	15.324.588.080,00		0,00	0%	N/A	0%	0%
2015	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%	N/A	0%	0%
2016	16.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%	N/A	0%	0%

Obligaciones/apropiación



Paso 4: Datos básicos del proyecto



0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.**
 Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica
 Apropriacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones
 Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.
 Fecha Límite de Registro: 05/03/2014
 Sin Resumen Ejecutivo

1995 -

Periodo: 2014 - E
Sin Fich

Imagen (Actualizar Borrar)

Corresponde a los %s de avance de los indicadores de producto BIS del proyecto en el periodo 2008 y 2013: por ello verá que el 2014 en adelante la sigla N/A

Información General .. (clic para expandir)

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Vigencia	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Avance Físico	Avance Físico	Avance Gestión	Avance Físico del Producto
2008-Dic	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.479.123.888,00	1.599.649.555,00	1.599.649.555,00	32%	0%	0%	N/A
2009-Dic	10.030.000.000,00	10.030.000.000,00	10.030.000.000,00	7.947.161.976,00	5.702.624.538,00	5.702.624.538,00	56,9%	100%	0%	N/A
2010-Dic	23.648.500.000,00	21.648.500.000,00	21.648.500.000,00	21.648.467.803,00	15.439.731.803,00	15.439.731.803,00	71,3%	25%	0%	N/A
2011-Dic	51.000.000.000,00	48.303.800.000,00	48.303.800.000,00	48.293.408.519,00	18.501.289.675,00	12.144.173.310,00	38,3%	0%	0%	N/A
2012-Dic	22.011.000.000,00	21.053.000.000,00	21.053.000.000,00	4.114.676.394,00	2.084.723.150,00	2.084.723.150,00	9,9%	0%	0%	N/A
2013-Dic	19.698.000.000,00	20.825.000.000,00	20.825.000.000,00	7.836.140.000,00	7.760.518.000,00	0,00	37%	0%	0%	N/A
2014-Ene	32.389.000.000,00	15.731.000.000,00	15.731.000.000,00	15.324.588.080,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%
2015	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%
2016	16.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%

Corresponde a los %s de avance de los productos desde 2014 (cadena de valor), verá que durante el periodo 2008 – 2013 estará la leyenda N/A



Paso 4: Datos básicos del proyecto

Información General .. (clic para expandir)

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Cadena de Valor .. (clic para expandir)

Al dar clic en este título se desplegará la cadena de valor del proyecto

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

Objetivo específico registrado en el SUIFP – BPIN

PRODUCTO: SENSORES

Actividades del producto:

- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS DE MULTILATERACION Y ADS(VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMATICA)

Producto, correspondiente al objetivo específico registrado en el SUIFP – BPIN

PRODUCTO: CENTROS DE CONTROL/SALAS RADAR/TORRES CONTROL/UNIDADES DE CONTROL

Actividades del producto:

- ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SALAS RADAR(INCLUYE OBRAS CIVILES)

Actividad, correspondiente al producto registrado en el SUIFP – BPIN

OBJETIVO: MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

OBJETIVO: Meta Rezagada 2013

Al presionar clic sobre el objetivo se desplegarán sus productos y actividades



Paso 4: Datos básicos del proyecto

Datos Básicos del Proyecto



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos



0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.**

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica

Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones

Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.

Fecha Límite de Registro: 05/03/2014

Sin Resumen Ejecutivo

Para que el módulo quede completo presione clic en este botón

1995 - 2016

Periodo: 2014 - Enero
Sin Ficha EBI

Imagen ([Actualizar](#) [Borrar](#))

[Resumen Ejecutivo](#) [Carregar Resumen](#)

A pesar que usted no habrá registrado información en este módulo el sistema validará que la cadena de valor del proyecto se encuentre completa.

Información General .. (clic para expandir)

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Cadena de Valor .. (clic para expandir)

Si la cadena de valor está incompleta en alguno de sus eslabones, deberá actualizar el proyecto en el SUIFP-BPIN



Paso 4: Datos básicos del proyecto

Para pasar al siguiente módulo pulse cualquiera de los botones de "modulo" del SPI

Datos Básicos del Proyecto



Datos Básicos


Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos

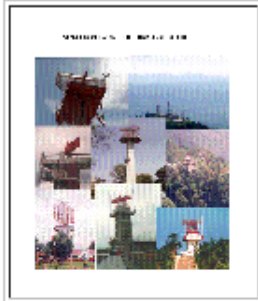

0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL**
Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica
Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones
Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013
Fecha Límite de Registro: 05/03/2014
Sin Resumen Ejecutivo

Al haber presionado el botón de validación y si toda la información está correcta, éste pasará de rojo a verde

95 - 2016
4 - Enero
n Ficha EBI

[Imagen](#) ([Actualizar](#) [Borrar](#))

[Resumen Ejecutivo](#) [Cargar Resumen](#)

- Información General .. (clic para expandir)
- Resumen Avances .. (clic para expandir)
- Cadena de Valor .. (clic para expandir)



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 5: Módulo Presupuestal



Paso 5: Módulo presupuestal



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos



0002080460000 ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica

Recursos PGN (nación y/o propios) y otras fuentes de financiación

Apropiación del proyecto del decreto de liquidación registrada en el SIIF

Apropiación inicial del proyecto, más o menos trámites presupuestales registrada en el SIIF

Pulse este botón para llevar a cabo la regionalización o la focalización de los recursos del proyecto

Ejecución Vigencia

Reservas Presupuestales

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Recursos Propios	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total PGN	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00	0,00	
	Empresa	\$100,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización
	Total Proyecto	\$2.100.000.100,00	\$2.100.000.100,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00	0,00	



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 5.1: Regionalización de presupuesto del proyecto



Paso 5.1: Regionalización de presupuesto

Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos



000 NIV. 000 ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A 1995 - 2016

Se... te Entidad: unidad especial aeronautica

: \$ 2.100,00 millones

ENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica

Regist... 05/03

Periodo: 2014 - Enero Sin Ficha EBI

Este botón le permitirá adicionar fuentes de financiación adicionales al PGN, resulta relevantes para los proyectos con APP

Al pulsar este botón podrá editar el tipo de fuente, los montos apropiados y los recursos ejecutados

	Fuente	Apropiación Inicial	App...	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Recursos Propios	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total PGN	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00	0,00	
	Empresa	\$100,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización
	Total Proyecto	\$2.100.000.100,00	\$2.100.000.100,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00	0,00	

Este botón le permitirá eliminar la fuente de financiación adicionada



Paso 5.1: Regionalización de presupuesto

Distribución Regional de Fuentes de Financiamiento

-
- Datos Básicos
- Presupuestal
- Productos
- Actividades
- Gestion
- Anexos



0002080460000 **ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.** 1995 - 2016

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica
 Apropriacion Vigente 2014: \$ 2.100,00 millones
 Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/05/2013
 Fecha Límite de Registro: 05/03/2014
 Sin Resumen Ejecutivo

Periodo: 2014 - Enero
Sin Ficha EBI

Le permitirá adicionar departamentos y municipios a la regionalización

% No Regionalizable: 0,00 %

Regionalización de la Inversión

Pasar Valores de Formulación a Vigente

Tipo de Fuente	Apropiación			Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Vigente			
Recursos Propios * Fecha Corte SIIF: 31/01/2014	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00
Total Distribución Regional	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

La línea de total para el tipo de Fuente debe ser igual a la línea Total Distribución Regional

Distribución Regional

	Departamento	Municipio	Inicial	Ref. Valor Formulación	Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Por Regionalizar	SIN MUNICIPIO	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Antioquia	MEDELLIN	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Antioquia	SIN MUNICIPIO	0		0	0	0	0

Al haber pulsado el botón de adicionar, podrá seleccionar departamento y municipio

Registrar el valor vigente destinado a ese departamento

Registra los valores comprometidos, obligados y pagados destinados hacia dicho departamento y/o municipio



Paso 5.1: Regionalización de presupuesto

Distribución Regional de Fuentes de Financiamiento



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Anexos

0002080460000 **ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.**
 Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica
 Apropriacion Vigente 2014: \$ 2.100,00 millones
 Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/05/2013 08:54:50 a.m.
 Fecha Límite de Registro: 05/03/2014
 Sin Resumen Ejecutivo

% No Regionalizable: 0,00 %

Si lo apropiado y/o ejecutado por el proyecto no concuerda con lo distribuido, el sistema mostrará rectángulos rojos alrededor de los ítems donde se encuentra el descuadre

Regionalización de la Inversión

Tipo de Fuente	Apropiación			Compromisos	Asignaciones	Pagos
	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Vigente			
Recursos Propios * Fecha Corte SIIF: 31/01/2014	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$5.700.000.000,00	\$0,00
Total Distribución Regional	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

La línea de total para el tipo de Fuente debe ser igual a la línea Total Distribución Regi

Se busca que lo apropiado y ejecutado por parte del proyecto corresponda a la distribución hecha por el usuario

Corresponde a la sumatoria de lo registrado para cada uno de los departamentos y/o municipios



Paso 5.1: Regionalización de presupuesto



0002080460000 **ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL**

1995 - 2016

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica

Apropiacion Vigente 2014: \$ 2.100,00 millones

Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/05/2013 08:54:50

Fecha Límite de Registro: 05/03/2014

Sin Resumen Ejecutivo

Periodo: 2014 - Enero

Sin Ficha EBI

Para validar la regionalización de recursos pulse este botón

% No Regionalizable: 0,00 %

Regionalización de la Inversión

Pasar Valores de Formulación a Vigente

Tipo de Fuente	Apropiación			Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Vigente			
Recursos Propios * Fecha Corte SIIF: 31/01/2014	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00
Total Distribución Regional	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

La línea de total para el tipo de Fuente debe ser igual a la línea Total Distribución Regional

0002080460000 **ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL**

1995 - 2016

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica

Apropiacion Vigente 2014: \$ 2.100,00 millones

Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/05/2013 08:54:50

Fecha Límite de Registro: 05/03/2014

Sin Resumen Ejecutivo

Periodo: 2014 - Enero

Sin Ficha EBI

Si la regionalización ha sido elaborada de manera correcta el link que antes estaba rojo, habrá pasado a verde en la página principal del módulo "presupuestal"

* Fecha Corte SIIF: 31/01/2014

Ejecución Vigencia

Reservas Presupuestales

Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
Recursos Propios	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
Total PGN	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00	0,00	



Paso 5: Módulo presupuestal

Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos



0002080460000 **ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.** 1995 - 2016

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica

Apropiacion Vigente 2014: \$ 2.100.000 millones

Responsable: NELSON MENDOZA CRUZ-unidad especial aeronautica

Fecha Control Posterior (Registrado en Web-BPIN): 07/05/2013 08:54:50 a.m.

Fecha Límite de Registro: 05/03/2014

Sin Resumen Ejecutivo

Periodo: 2014 - Enero
Sin Ficha EBI

* Fecha Corte SIIF: 31/01/2014

Ejecución Vigente

Reservas Presupuestales

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Recursos Propios	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total PGN	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$15.700.000.000,00	\$0,00	0,00	

Para validar la información registrada en el módulo pulse este botón, si la información de avance ha sido incluida de forma correcta el botón "presupuestal" pasará a verde




DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 5.2: Focalización de recursos del proyecto

Paso 5.2: Focalización de recursos del proyectos

Focalización de Recursos por Fuente de Financiamiento

- Datos Básicos Presupuestal Productos Actividades Gestion Anexos



0027021960000 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.
 Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica
 Apropriacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones
 Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.
 Fecha Límite de Registro: 05/03/2014
 Sin Resumen Ejecutivo

Fuente Financiación: **Aportes Nacion**

Tecnologías de información y comunicaciones Asignación Vigente: \$ 15.731.000.000,00

	Categoría	Apropiacion Inicial	Apropiacion Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Aplicaciones / software	\$ 3.146.200.000,00	\$ 3.146.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Infraestructura/hardware	\$ 11.011.700.000,00	\$ 11.011.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Servicios	\$ 1.573.100.000,00	\$ 1.573.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Total Distribuido	\$ 15.731.000.000,00	\$ 15.731.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Pulse el botón para registrar los montos que han sido apropiados y ejecutados en la categoría de focalización definida en el SUIFP

Tecnologías de información y comunicaciones Asignación Vigente: \$ 15.731.000.000,00

	Categoría	Apropiacion Inicial	Apropiacion Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Aplicaciones / software	\$ 3.146.200.000,00	\$ 3.146.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Infraestructura/hardware	\$ 11.011.700.000,00	\$ 11.011.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Servicios	\$ 1.573.100.000,00	\$ 1.573.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Total Distribuido	\$ 15.731.000.000,00	\$ 15.731.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Hecho el registro para la categoría pulse el botón guardar



Paso 5.2: Focalización de recursos del proyectos

Focalización de Recursos por Fuente de Financiamiento



Datos Básicos


Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos



0027 021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL**
Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica
Apropiación Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones
Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.
Fecha Límite de Registro: 05/03/2014
Sin Resumen Ejecutivo

Fuente Financiación: **Aportes Nacion**

Tecnologías de información y comunicaciones Asignación Vigente: \$ 15.731.000.000,00

	Categoría	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Aplicaciones / software	\$ 3.146.200.000,00	\$ 3.146.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Infraestructura/hardware	\$ 11.011.700.000,00	\$ 11.011.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Servicios	\$ 1.573.100.000,00	\$ 1.573.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Total Distribuido	\$ 15.731.000.000,00	\$ 15.731.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Para validar la información registrada pulse este botón



0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL**
Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica
Apropiación Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones
Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.
Fecha Límite de Registro: 05/03/2014
Sin Resumen Ejecutivo

Periodo: 2014 - Enero
Sin Ficha EBI

Para validar la información registrada pulse este botón

* Fecha Corte SIIF: 31/01/2014

Ejecución Vigencia

Reservas Presupuestales

Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
Aportes Nacion	\$2.776.000.000,00	\$2.776.000.000,00	\$2.769.504.000,00	\$0,00	\$0,00	0,0	Focalización
Recursos Propios	\$12.955.000.000,00	\$12.955.000.000,00	\$12.555.084.080,00	\$0,00	\$0,00	0,0	Focalización
Total PGN	\$15.731.000.000,00	\$15.731.000.000,00	\$15.324.588.080,00	\$0,00	\$0,00	0,00	
Total Proyecto	\$15.731.000.000,00	\$15.731.000.000,00	\$15.324.588.080,00	\$0,00	\$0,00	0,00	

Al haber pulsado el botón el link de "focalización" habrá pasado de rojo a verde



Paso 5: Módulo presupuestal

Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos



0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES** ...

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica

Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones

Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.

Fecha Límite de Registro: 05/03/2014

Sin Resumen Ejecutivo

1995 - 2016

2014 - Enero

Sin Ficha EBI

Para validar la información registrada en el módulo presione el botón de "validación", en ese momento el sistema

* Fecha Corte SIIF: 31/01/2014

Ejecución Vigencia

Reservas Presupuestales

Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
Aportes Nacion	\$2.776.000.000,00	\$2.776.000.000,00	\$2.769.504.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Focalización
Recursos Propios	\$12.955.000.000,00	\$12.955.000.000,00	\$12.555.084.080,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Focalización
Total PGN	\$15.731.000.000,00	\$15.731.000.000,00	\$15.324.588.080,00	\$0,00	\$0,00	0,00	
Total Proyecto	\$15.731.000.000,00	\$15.731.000.000,00	\$15.324.588.080,00	\$0,00	\$0,00	0,00	

Total: 4



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 6: Módulo de producto



Paso 6: Módulo producto



0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.**

1995 - 2016

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica

Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones

Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.

Fecha Límite de Registro: 05/03/2014

Sin Resumen Ejecutivo



De clic en el objetivo para visualizar sus productos y los indicadores asociados a ellos

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

OBJETIVO: MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

OBJETIVO: Meta Rezagada 2013

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

PRODUCTO: SENSORES

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2014	Meta Total Proyecto 1995 - 2016	Avance Acumulado 1995 - 2013	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	Meta Rezagada 2013	Avance Rezago 2014	Regionalizable 2014	% Avance Vigencia 2014	% Avance Rezagado 2014	Observación Mensual [Ⓜ]
	SENSORES Adquiridos Vigilancia Aeronáutica Adquiridos Vigilancia Aeronáutica	Número - Número: Cantidad	100	8,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PRODUCTO: CENTROS DE CONTROL/SALAS RADAR/TORRES CONTROL/UNIDADES FLUJO



Paso 6: Módulo producto

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

PRODUCTO: SENSORES

Presione el botón para registrar el avance del producto

Indicador del Producto

Todos <input type="checkbox"/>	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso	Meta Total Proyecto 1995 - 2016	Avance Acumulado 1995 - 2013	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	Meta Rezagada 2013	Avance Rezagado 2014	Regionalizable 2014	% Avance Vigencia 2014	% Avance Rezagado 2014	Observación Mensual [Ⓢ]
	SENSORES Adquiridos Vigilancia Aeronáutica Adquiridos Vigilancia Aeronáutica	Número Número: Cantidad	100	8,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PRODUCTO: CENTROS DE CONTROL/SALAS RADAR/TORRES CONTROL/UNIDADES FLUJO

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

PRODUCTO: SENSORES

Indicador del Producto

Todos <input type="checkbox"/>	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2014	Meta Total Proyecto 1995 - 2016	Avance Acumulado 1995 - 2013	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	Meta Rezagada 2013	Avance Rezagado 2014	Regionalizable 2014	% Avance Vigencia 2014	% Avance Rezagado 2014	Observación Mensual [Ⓢ]
	9999P999 SENSORES Adquiridos Vigilancia Aeronáutica Adquiridos Vigilancia Aeronáutica	Número Número: Cantidad	100	8	0	5	0	0	0		0,00	0,00	

PRODUCTO: CENTROS DE CONTROL/SALAS RADAR/TORRES CONTROL/UNIDADES FLUJO



Paso 6: Módulo producto

Meta total del proyecto registrada en el SUIFP

Avance acumulado del indicador hasta 2013

Meta para el 2014 registrada en el SUIFP

Registra el avance del producto en la vigencia

Meta rezagada en el año anterior

Registra el avance rezago en la vigencia

OBJETIVO: DESARROLLAR... AS DE VIGILANCIA AERONÁUTICA

PRODUCTO: SENSORES

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2014	Meta Total Proyecto 1995 - 2016	Avance Acumulado 1995 - 2013	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	Meta Rezagada 2013	Avance Rezagado 2014	Regionalizable 2014	% Avance Vigencia 2014	% Avance Rezagado 2014
<input type="checkbox"/>	9999P999 SENSORES Adquiridos Vigilancia Aeronáutica Adquiridos Vigilancia Aeronáutica	Número Número: Cantidad	100	8	0	5	0	0	0		0,00	0,00

PRODUCTO: CENTROS DE CONTROL/SALAS RADAR/TORRES CONTROL/UNIDADES...

Debe registrar una observación en caso que el avance sea mayor que la meta

% Avance vigencia/meta vigente

% Avance rezagado/meta rezagada

Registra los avances logrados o no logrados. En caso de más de 3 líneas utilice un anexo



Paso 6: Módulo producto

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

PRODUCTO: SENSORES

Indicador del Producto

Todos <input type="checkbox"/>	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2014	Meta Total Proyecto 1995 - 2016	Avance Acumulado 1995 - 2013	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	Meta Rezagada 2013	Avance Rezagado 2014	Regionalizable 2014	% Avance Vigencia 2014	% Avance Rezagado 2014	Observación Mensual [Ⓜ]
	9999P999 SENSORES Adquiridos Vigilancia Aeronáutica Adquiridos Vigilancia Aeronáutica	Número Número: Cantidad	100	8	0	5	3	0	0		0,00	0,00	<input type="text"/>

PRODUCTO: CENTROS DE CONTROL/SALAS RADAR/TORRES CONTROL/UNIDADES FLUJO

Registre el avance rezagado

Registre el avance del producto

Indicador del Producto

Todos <input type="checkbox"/>	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2014	Meta Total Proyecto 1995 - 2016	Avance Acumulado 1995 - 2013	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	Meta Rezagada 2013	Avance Rezagado 2014	Regionalizable 2014	% Avance Vigencia 2014	% Avance Rezagado 2014	Observación Mensual [Ⓜ]
	9999P999 SENSORES Adquiridos Vigilancia Aeronáutica Adquiridos Vigilancia Aeronáutica	Número Número: Cantidad	100	8	0	5	3	0	0		0,00	0,00	<input type="text"/>

Al terminar el registro pulse el botón de "guardar"



Paso 6: Módulo producto

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

OBJETIVO: MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

OBJETIVO: Meta Rezagada 2013

PRODUCTO: Meta Rezagada 2013

Indicador del Producto

Indicadores de Producto del BIS

Todos <input type="checkbox"/>	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2014	Meta Total Proyecto 1995 - 2016	Avance Acumulado 1995 - 2013	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	Meta Rezagada 2013	Avance Rezaqo 2014	Regionalizable 2014	% Avance Vigencia 2014	% Avance Rezaqado 2014	Observación Mensual [?]
	0600P257 Sistemas De Vigilancia Aeron Utica Actualizados. -	Número - Número: Cantidad	0	16,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total: 1

El sistema traerá los indicadores de producto del BIS que presentan metas rezagadas de 2013 y que no fueron asociados a un producto en el SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 6.1: Módulo de regionalización de producto



Paso 6.1: Módulo de regionalización de producto

OBJETIVO: FORTALECER EL APOYO LOGISTICO PARA LA PRESTACION DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS CNS-MET Y ENERGIA INSTALADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL

PRODUCTO: VEHICULOS

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2014	Meta Total Proyecto 2002 - 2016	Avance Acumulado 2002 - 2013	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	Meta Rezagada 2013	Avance Rezaño 2014	Regionalizable 2014	% Avance Vigencia 2014	% Avance Rezagado 2014	Observación Mensual [Ⓢ]
	VEHICULOS Adquiridos para operación aeronáutica y aeroportuaria Adquiridos para operación aeronáutica y aeroportuaria	Número - Número: Cantidad	100	18,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	Regionalización	60,00	0,00	

Pulse este link para regionalizar los avances de los productos y/o los indicadores de producto del BIS



Paso 6.1: Módulo de regionalización de producto



1015001030000 REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AERONAUTICO PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA	2002 - 2016
Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica Apropiación Vigente 2014: \$ 700,00 millones Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 10/04/2013 12:48:02 p.m. Fecha Límite de Registro: 05/03/2014 Sin Resumen Ejecutivo	Periodo: 2014 - Enero Sin Ficha EBI
% No Regionalizable: 0,00 %	

Mediante este botón puede adicionar departamento y/o municipios al proceso de regionalización

Regionalización del Indicador

Tipo Indicador: PRODUCTO Indicador: 9999P999 - VEHICULOS Adquiridos para operación aeronáutica y aeroportuaria

	Meta SUIFP	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezagado
Total Indicador	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

Distribución Regional

Seleccionar Todos <input type="checkbox"/>	Departamento	Municipio	Meta SUIFP	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezagado
	Antioquia <input type="checkbox"/>	SIN MUNICIPIO <input type="checkbox"/>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Atlántico <input type="checkbox"/>	SIN MUNICIPIO <input type="checkbox"/>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	SIN MUNICIPIO <input type="checkbox"/>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	SIN MUNICIPIO <input type="checkbox"/>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	M. <input type="checkbox"/>	SIN MUNICIPIO <input type="checkbox"/>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	N. S. <input type="checkbox"/>	SIN MUNICIPIO <input type="checkbox"/>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Valle <input type="checkbox"/>	SIN MUNICIPIO <input type="checkbox"/>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Mediante este botón se lleva a cabo el registro de la regionalización del producto y los indicadores de producto BIS



Paso 6.1: Módulo de regionalización de producto

Metas y avances del producto o indicador de producto BIS

CULOS Adquiridos para operación aeronáutica y aeroportuaria Adquiridos para operación aeronáutica y aeroportuaria

Meta SUIFP	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezagado
7,00	5,00	0,00	3,00	0,00

Suma de las metas y avances del producto de los departamentos y/o municipios

Meta SUIFP	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezagado
7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

Municipio	Meta SUIFP	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezagado
Antioquia	1,00	1,00	0,00	1	0,00
Atlantico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Bogota	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cundinamarca	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Meta	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
N. Santander	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Valle	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



Paso 6.1: Módulo de regionalización de producto



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos



1015001030000 REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUT INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA	2002 - 2016
Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica	
Apropiacion Vigente 2014: \$ 700,00 millones	
Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aero	
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 10/	
Fecha Límite de Registro: 05/03/2014	Periodo: 2014 - Enero
Sin Resumen Ejecutivo	Sin Ficha EBI
% No Regionalizable: 0,00 %	

Para validar la regionalización de productos e indicadores de producto del BIS

Regionalización del Indicador

Tipo Indicador: PRODUCTO Indicador: 9999P999 - VEHICULOS Adquiridos para operación aeronáutica y aeroportuaria Adquiridos para operación aeronáutica y aeroportuaria

	Meta SUIFP	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezagado
	7,00	5,00	0,00	3,00	0,00
Total Indicador		7,00	0,00	2,00	0,00

Si la regionalización ha sido diligenciado de manera correcta el link de regionalización pasará de rojo a verde

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2014	Meta Total Proyecto 2002 - 2016	Avance Acumulado 2002 - 2013	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	Reza 2013	Avance 2014	Regionalizable 2014	% Avance Vigencia 2014	% Avance Rezagado 2014	Observación Mensual
	VEHICULOS Adquiridos para operación aeronáutica y aeroportuaria Adquiridos para operación aeronáutica y aeroportuaria	Número Número: Cantidad	100	18,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	<u>Regionalización</u>	60,00	0,00	



Paso 6: Módulo producto

Información de Indicadores



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos



	<p>0027021960000 AMPLIACION RED DE RADARES AERONAUTICOS NACIONAL.</p> <p>Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica</p> <p>Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones</p> <p>Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica</p> <p>Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 pm</p> <p>Fecha Límite de Registro: 05/03/2014</p> <p>Sin Resumen Ejecutivo</p>	<p>1995 - 2016</p> <p>Periodo: 2014 - Enero</p> <p>Sin Ficha EBI</p>
--	--	--

Para validar el registro de los productos del proyecto, pulse este botón

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

OBJETIVO: MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA

OBJETIVO: Meta Rezagada 2013



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 7: Módulo de actividades



Paso 7: Módulo de actividades

Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos



0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.**
 Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica
 Apropriacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones
 Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.
 Fecha Límite de Registro: 05/03/2014
 Sin Resumen Ejecutivo

1995 - 2016

Periodo: 2014 - Enero
Sin Ficha EBI

Ejecución Financiera	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Obligación	Total Obligación
Total PGN	15.731.000.000	15.731.000.000	0	23.731.000.000
Otras Fuentes	0	0	0	0

Ejecución PGN
 Otras Fuentes
 Cronológico

Registra las obligaciones de las actividades de todas las fuentes de financiación del proyecto

Pulse "objetivo" para desplegar los productos y sus actividades

- OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA .. (Click para expandir)
[OBLIGADO PGN = \$6.500.000.000]
- OBJETIVO: MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA .. (Click para expandir)
[OBLIGADO PGN = \$17.000.000.000]
- OBJETIVO: Meta Rezagada 2013 .. (Click para expandir)
[OBLIGADO PGN = \$0]



Paso 7: Módulo de actividades

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA .. (Click para expandir)

[OBLIGADO PGN = \$6.500.000.000]

PRODUCTO: SENSORES .. (Click para expandir)

[OBLIGADO PGN = \$6.500.000.000]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS DE MULTILATERACION Y ADS(VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMATICA)	PGN	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000.000,00	
	Total Producto	PGN	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000.000,00	

Pulse el botón de editar, para registrar el valor que se ha obligado de la actividad

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA .. (Click para expandir)

[OBLIGADO PGN = \$6.500.000.000]

PRODUCTO: SENSORES .. (Click para expandir)

[OBLIGADO PGN = \$6.500.000.000]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: ADQUISICION	PGN	\$0,00	\$0,00	<input type="text" value="100000000"/>	
	Total Producto	PGN	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000.000,00	

Total: 1

Al terminar de registrar las obligaciones de la actividad pulse el botón de "guardar"



Paso 7: Módulo de actividades

0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.**

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica

Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones

Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56 p.m.

Fecha Límite de Registro: 05/03/2014

Sin Resumen Ejecutivo

1995 - 2016

Periodo: 2014 - Enero

Sin Ficha EBI

Registra la suma de las obligaciones de sus actividades

Registra la suma de las obligaciones de sus actividades

Ejecución Financiera	Apropiacion inicial	Apropiacion vigente	Obligación	Total Obligado
Total PGN	15.731.000.000	15.731.000.000	0	23.500.000.000
Otras Fuentes	0	0	0	0

Ejecución PGN
 Otras Fuentes
 Cronológico

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA .. (Click para expandir) [OBLIGADO PGN = \$6.500.000.000]

PRODUCTO: SENSORES .. (Click para expandir) [OBLIGADO PGN = \$6.500.000.000]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual [Ⓜ]
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios:	PGN	\$0,00	\$0,00	6500000000	
	Total Producto	PGN	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000.000,00	

Registra los avances logrados o no logrados. En caso de más de 3 líneas utilice un anexo



Paso 7: Módulo de actividades

0027021960000 **AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.** 1995 - 2016

Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica

Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones

Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:00

Fecha Límite de Registro: 05/03/2014

Sin Resumen Ejecutivo

Periodo: 2014 - Enero
Fecha EBI

Muestra lo apropiado y obligado para todo el proyecto

Corresponde a la suma del registro de las obligaciones de todas las actividades del proyecto

Ejecución Financiera	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Obligación	Total Obligado
Total PGN	15.731.000.000	15.731.000.000	0	23.500.000.000
Otras Fuentes	0	0	0	

Ejecución PGN Otras Fuentes Cronológico

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA ... (Click para expandir) [OBLIGADO PGN = \$6.500.000.000]

PRODUCTO: SENSORES ... (Click para expandir) [OBLIGADO PGN = \$6.500.000.000]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios	PGN	\$0,00	\$0,00	6500000000	
Total Producto		PGN	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000.000,00	

La suma del registro de las obligaciones de todas las actividades del proyecto debe ser igual al total de la obligación



Paso 7: Módulo de actividades

Se visualiza las fechas de inicio y finalización programadas de la actividad las cuales fueron incluidas en el SUIFP

Ejecución PGN Otras Fuentes Cronológico

OBJETIVO: DESARROLLAR SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA .. (Click para expandir)

[OBLIGADO OTRAS = \$0]

PRODUCTO: SENSORES .. (Click para expandir)

[OBLIGADO OTRAS = \$0]

Actividades del producto:

Actividad	RC [?]	Fecha Programada (SUIFP-BPIN) [?]
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS DE MULTILATERACION Y ADS(VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMATICA)	<input type="checkbox"/>	Inicio 16/03/2013 Termina 31/12/2016

Total: 1

PRODUCTO: CENTROS DE CONTROL/SALAS RADAR/TORRES CONTROL/UNIDADES FLUJO .. (Click para expandir)

[OBLIGADO OTRAS = \$0]



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 8: Módulo de Gestión



Paso 8: Módulo de Gestión

El sistema trae los indicadores de gestión registrados en el SUIFP

Ponderación de indicador de gestión registrada en el SUIFP

Información de Indicadores



00350000 **SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA** 2003 - 2015

Sector: vivienda y territorio Entidad: fondo nacional de vivienda vivienda

Apropiación 2014: \$ 782.300,00 millones

Responsable: AIDA RIVERA -fondo nacional de vivienda - fondo

Fecha Contable: anterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 13/01/2013 04:37:20 p.m.

Fecha Límite de Registro: 05/03/2014

Sin Resumen

Periodo: 2014 - Enero
Sin Ficha EBI

Datos Básicos Presupuestal Producción Estadísticas Gestión Anexos

Busca

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2014	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	% Avance Vigencia 2014	Observación Mensual
	1400G018 Cronograma anual de asignación publicado -	Número - Número: Cantidad	10	1,00	0,00	0,00	
	1400G019 Subsidios que están en proceso de asignación	Número - Número: Cantidad	80	17.749,00	0,00	0,00	
	9900G026 Convocatorias Abiertas -	Número - Número: Cantidad	10	7,00	0,00	0,00	

Pulsa el botón para registrar el avance de la meta del indicador



Paso 8: Módulo de gestión

Información de Indicadores



- Datos Básicos
- Presupuestal
- Productos
- Actividades
- Gestion
- Anexos



0035000010 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
 Sector: vivienda, ciudad y territorio Entidad: fondo nacional de vivienda - fonvivienda
 Apropiación: Presupuesto 2014: \$ 782.300,00 millones
 Responsable: RAIDA RIVERA -fondo nacional de vivienda - fonvivienda
 Fecha Comprobación: Superior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 11/12/2013 04:37:20 p.m.
 Fecha Límite de Registro: 05/03/2014
 Sin Resultados

2003 - 2015

Periodo: 2014 - Enero
Sin Ficha EBI

En caso que el avance supere la meta, debe registrarse observación

Terminado el registro del avance de todos los indicadores pulse el botón de validar

Buscar BIS

Unidad de Medida	% Peso 2014	Meta Vigente 2014	Avance Vigencia 2014	% Avance Vigencia 2014	Observación Mensual
Número: Cantidad	10	1,00	0,00	0,00	
1400G019 Subsidios que entran en proceso de asignación -	80	17.749,00	0,00	0,00	
9900G026 Convocatorias Abiertas -	10				

Registra el avance de la meta de gestión

Registra los avances logrados o no logrados. En caso de más de 3 líneas utilice un anexo



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Paso 9: Anexos



Paso 9: Anexos

Ver Anexos

Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos



	0027021960000 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	1995 - 2016
	Sector: transporte Entidad: unidad especial aeronautica	
	Apropiacion Vigente 2014: \$ 15.731,00 millones	
	Responsable: NELSON MENDIVELSO CRUZ-unidad especial aeronautica	
	Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 07/10/2013 06:06:56	
Fecha Límite de Registro: 05/03/2014		Periodo: 2014 - Enero
Sin Resumen Ejecutivo		Sin Ficha EBI

Pulse este botón para agregar un documento anexo

Anexar Documento (El tamaño de los anexos disponible para este periodo es: 21 Mb)

Seleccionar	Vigencia	Periodo	Fecha	Descripción	Descarga	Tamaño
-------------	----------	---------	-------	-------------	----------	--------

Ver Anexos

Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestion

Anexos

Pulse el botón para seleccionar el documento a anexar (sólo puede tener extensión .pdf o .zip)

	0027021960000 A	06:06:56 p.m.	Periodo: 2014 - Enero
	Sector: transporte B		Sin Ficha EBI
	Apropiacion Vigente		
	Responsable: NELS		
	Fecha Control Post		
Fecha Límite de Reg			
Sin Resumen Ejecutivo			

Para guardar el documento pulse este botón

Anexar Documento (El tamaño de los anexos disponible para este periodo es: 21 Mb)

Seleccionar	Vigencia	Periodo	Fecha	Descripción	Descarga	Tamaño
				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Examinar..."/>



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Datos de Contacto

Tel. (+57 1) 3815000
Calle 26 13-19 Piso XX
Bogotá - Colombia

www.dnp.gov.co
